



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: OBRA DE MANUTENÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA CÂMARA DOS VEREADORES DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX/PE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEMÓRIA	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
			0,13	
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	Evolução de 0,317%	0,32
2	SERVIÇOS PRELIMINARES			
2.3	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	= * PAREDES: (76,50 M²) BWC 01: (3,00+1,35)*2,80*2-(0,60*2,10) = 23,10 M² BWC 02: (3,00+1,35)*2,80*2-(0,60*2,10) = 23,10 M² COPA: (3,11+3,00)*2,80*2-(0,80*2,10+1,40*1,60) = 30,30 M² * PISO: (17,50 M²) BWC 01 = 4,05 M² BWC 02 = 4,05 M² COPA = 9,40 M² TOTAL = 94,00 M²	94
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
7.1	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UN	9,00	9,00
7.2	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	45,00	45,00
7.4	Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021	un	13,00	13,00
7.5	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w	un	43,00	43,00
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			
8.6	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	2,00
8.7	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1,00
9	PINTURA			
10	DIVERSOS			
10.1	Tampo de balcão em granito preto, e=2cm	m²	= RECEPÇÃO: (2,75*0,60+1,65*0,60+0,75*0,50+3,20*1,10+1,20*0,60+0,65*0,40+1,60*0,60+0,80*0,60) = 10,68 M²	10,68
10.2	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	M	= 5,00 M	5,00

Anderson Luis Lemos de Melo
Engenheiro Civil
CREA 1819593479PE

Vandilson Manoel dos Santos
Presidente
CPF: 105.239.744-18

ETARUANDA
EMPREENDIMENTOS
Rua Coronel José Pessoa, 17 / Loja 201
Centro - Bezerros-PE - CEP 55.660-000
CNPJ. 39.357.688/0001-05

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX



2ª BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATA: TARIJUNDA EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 39.357.688/0001-05		DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 18/10/2023		LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE		VIGÊNCIA DO CONTRATO: 31/12/2023		PERÍODO DA MEDIÇÃO: 07/11/2023 à 28/11/2023		VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 36.907,22		
OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA CÂMARA DOS VEREADORES DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX/PE		PROCESSO LICITATÓRIO: 005/2023		DISPENSA: 001/2023		CONTRATO: 020/2023		VALOR: R\$ 111.483,44		SALDO A MEDIR		
PLANOJA CONTRATUAL		QUANTIDADES MEDIDAS		VALORES MEDIDOS (R\$)		ACUMULADO TOTAL		ACUMULADO ANTERIOR		VALORES		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	VALORES TOTAIS	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	QUANTIDADE	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1	R\$ 3.822,00	R\$ 4.774,44	R\$ 4.774,44	R\$ 4.774,44	0,32	R\$ 620,67	R\$ 1.515,25	R\$ 2.136,62	55,24%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	4	R\$ 302,37	R\$ 377,72	R\$ 1.510,88	R\$ 9.820,03	4,00	R\$ 7.841,79	R\$ 1.496,48	R\$ 9.138,27	1,95%
2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_P5	m²	658,53	R\$ 7,46	R\$ 9,31	R\$ 6.130,91	658,53	94,00	R\$ 6.130,91	R\$ 1.496,48	R\$ 1.496,48	0,00%
2.2	Remoção de pintura látex (respingos) e/ou itramento (ou escovado)	m²	94	R\$ 12,75	R\$ 15,92	R\$ 1.496,48						0,00%
2.3	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM DEFORMAÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m³	2,65	R\$ 54,91	R\$ 68,59	R\$ 181,76						0,00%
4	ALVENARIA	m³	4,92	R\$ 80,97	R\$ 101,02	R\$ 497,01						100,00%
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM	m³	9,84	R\$ 4,96	R\$ 5,84	R\$ 9.300,81						100,00%
5	REVESTIMENTO	m²	9,84	R\$ 43,74	R\$ 54,64	R\$ 537,65						100,00%
5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	76,5	R\$ 91,10	R\$ 113,80	R\$ 8.705,70						100,00%
5.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_08/2014	m²	17,5	R\$ 104,52	R\$ 130,56	R\$ 2.284,80						100,00%
5.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	76,5	R\$ 91,10	R\$ 113,80	R\$ 8.705,70						100,00%
6	PISO	m²	17,5	R\$ 104,52	R\$ 130,56	R\$ 2.284,80						100,00%
6.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	15	R\$ 131,64	R\$ 164,44	R\$ 2.466,60						0,00%
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN	1	R\$ 174,97	R\$ 218,57	R\$ 437,14						100,00%
7.1	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUÉBRUA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UN	15	R\$ 131,64	R\$ 164,44	R\$ 2.466,60						0,00%
7.2	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embudo Ø 3/4"	un	45	R\$ 283,44	R\$ 354,07	R\$ 15.933,15						0,00%
7.3	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10	R\$ 28,72	R\$ 35,87	R\$ 358,70						0,00%
7.4	Luminária Painel Led embutir 15w quadrada, 6000K dia G-light ou similar - Rev 01_11/2021	un	13	R\$ 89,74	R\$ 87,11	R\$ 1.132,43						0,00%
7.5	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w G-light ou similar - Rev 01_11/2021	un	43	R\$ 88,63	R\$ 110,71	R\$ 4.760,53						0,00%
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	un	7	R\$ 83,80	R\$ 104,43	R\$ 731,01						54,56%
8.1	Revisão de ponto de água tipo 2 - Rev 01	un	7	R\$ 93,12	R\$ 116,32	R\$ 814,24						0,00%
8.2	Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev 01	un	2,62	R\$ 518,87	R\$ 648,17	R\$ 1.633,38						100,00%
8.3	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	2	R\$ 174,97	R\$ 218,57	R\$ 437,14						100,00%
8.4	Cuba de louça de embutir (ovai ou circular) inclusive bife plástico, válvula plástica para pia e ergatejo plástico	un	1	R\$ 314,95	R\$ 393,43	R\$ 393,43						100,00%
8.5	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL LUÉRIA, INCLUSO VALVULO, ERGATEJO EM METAL CROMIADO E BIFE, FLEXÃO EM PVC, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	R\$ 314,95	R\$ 393,43	R\$ 393,43						100,00%

Anderson Luis Lemos de Melo
Empreendedor Civil
CPF: 1919593479PE

Vandellson Manoel dos Santos
Presidente
CPF: 105.239.744-18

TARIJUNDA
EMPREENDIMENTOS
Rua Coronel José Pessoa, 17 / Loja 201
Centro - Bezerros - PE - CEP 55.660-000
CNPJ: 39.357.688/0001-05

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX



2º BOLETIM DE MEDIÇÃO												
CONTRATADA: TARLUANDA EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 39.357.688/0001-05			LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE			VIGÊNCIA DO CONTRATO: 31/12/2023			PERÍODO DA MEDIÇÃO: 07/11/2023 à 28/11/2023			
OBJETO: OBRAS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA CÂMARA DOS VEREADORES - PROCESSO LICITATÓRIO: 005/2023			DISPENSA: 003/2023			CONTRATO: 020/2023			VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 36.907,22			
PLANOILHA CONTRATUAL			QUANTIDADES MEDIDAS			VALORES MEDIDOS (R\$)			SALDO A MEDIR			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	VALORES TOTAIS	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	QUANTIDADE	VALORES	%
8.6	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÍDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2	R\$ 131,40	R\$ 164,14	R\$ 328,28	R\$ -	R\$ 328,28	R\$ 328,28	2,00	R\$ -	0,00%
8.7	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÍDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1	R\$ 146,69	R\$ 146,69	R\$ 146,69	R\$ -	R\$ 146,69	R\$ 146,69	1,00	R\$ -	0,00%
9	PINTURA					R\$ 28.853,87			R\$ 4.912,86		R\$ 20.941,01	80,99%
9.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF. 04/2023	m²	658,53	R\$ 3,87	R\$ 4,85	R\$ 3.180,69	R\$ 658,53	-	R\$ 3.180,69	658,53	R\$ -	0,00%
9.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL, AF. 04/2023	m²	658,53	R\$ 15,55	R\$ 19,42	R\$ 12.786,65	R\$ 89,20	-	R\$ 1.732,17	658,53	R\$ 11.056,48	86,45%
9.3	PINTURA LÁTEX AGRÍCOLA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF. 04/2023	m²	658,53	R\$ 12,02	R\$ 15,01	R\$ 9.884,53	-	-	R\$ -	658,53	R\$ 9.884,53	100,00%
10	DIVERSOS					R\$ 28.091,69			R\$ 10.113,75		R\$ 18.867,94	65,10%
10.1	Tampo de balcão em granito preto, 90x20m	m²	10,68	R\$ 714,70	R\$ 892,80	R\$ 9.535,10	R\$ -	-	R\$ 9.535,10	10,68	R\$ -	0,00%
10.2	ESCALA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-S0 9,52MM INCLUI PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCÃO	M	5	R\$ 92,85	R\$ 115,73	R\$ 578,65	R\$ -	-	R\$ 578,65	5,00	R\$ -	0,00%
10.3	Foto de madeira lambril pau d	m²	98	R\$ 154,13	R\$ 192,53	R\$ 18.867,94	R\$ -	-	R\$ -	98,00	R\$ 18.867,94	100,00%
11	ARRUMATES FINAIS					R\$ 1.315,21			R\$ -		R\$ 1.315,21	100,00%
11.1	Limpeza geral	m²	429,81	R\$ 2,45	R\$ 3,06	R\$ 1.315,21	R\$ -	-	R\$ -	429,81	R\$ 1.315,21	100,00%
						R\$ 111.463,44			R\$ 52.973,12		R\$ 58.490,31	52,47%
						VALOR ACUMULADO			R\$ 52.973,12		R\$ 58.490,31	
						SALDO DO CONTRATO			R\$ 36.907,22		R\$ 36.907,22	
						VALOR DA MEDIÇÃO			R\$ 36.907,22		R\$ 36.907,22	

TARLUANDA
EMPREENDEIMENTOS

Rua Coronel José Pessoa, 177 - Torre 201
Centro - Bezerros-PE - CEP 55.660-000
CNPJ. 39.357.688/0001-05

Vandelson Manoel dos Santos
Presidente
CPF: 105.239.744-18

ANDERSON LUIS SILVA DE MELO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA PE 180158785-0
Anderson Luis Lemos de Melo
Engenheiro Civil
CREA 181959347-0PE



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: OBRA DE MANUTENÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA CÂMARA DOS VEREADORES DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX/PE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEMÓRIA	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
			0,13	
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	Evolução de 0,317%	0,32
2	SERVIÇOS PRELIMINARES			
2.3	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	= * PAREDES: (76,50 M²) BWC 01: (3,00+1,35)*2,80*2-(0,60*2,10) = 23,10 M² BWC 02: (3,00+1,35)*2,80*2-(0,60*2,10) = 23,10 M² COPA: (3,11+3,00)*2,80*2-(0,80*2,10+1,40*1,60) = 30,30 M² * PISO: (17,50 M²) BWC 01 = 4,05 M² BWC 02 = 4,05 M² COPA = 9,40 M² TOTAL = 94,00 M²	94
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
7.1	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UN	9,00	9,00
7.2	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	45,00	45,00
7.4	Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021	un	13,00	13,00
7.5	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w	un	43,00	43,00
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			
8.6	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	2,00
8.7	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1,00
9	PINTURA			
10	DIVERSOS			
10.1	Tampo de balcão em granito preto, e=2cm	m²	= RECEPÇÃO: (2,75*0,60+1,65*0,60+0,75*0,50+3,20*1,10+1,20*0,60+0,65*0,40+1,60*0,60+0,80*0,60) = 10,68 M²	10,68
10.2	ESCALADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	M	= 5,00 M	5,00

Anderson Luis Lemos de Melo
Engenheiro Civil
CREA 819593479PE

Vandeilson Manoel dos Santos
Presidente
CPF: 105.239.744-18

TETARUANDA
EMPREENDIMENTOS
Rua Coronel José Pessoa, 17 / Loja 201
Centro - Bezerros-PE - CEP 55.660-000
CNPJ. 39.357.688/0001-05



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

2º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: OBRA DE MANUTENÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA CÂMARA DOS VEREADORES DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX/PE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 01



Foto 02



Foto 03


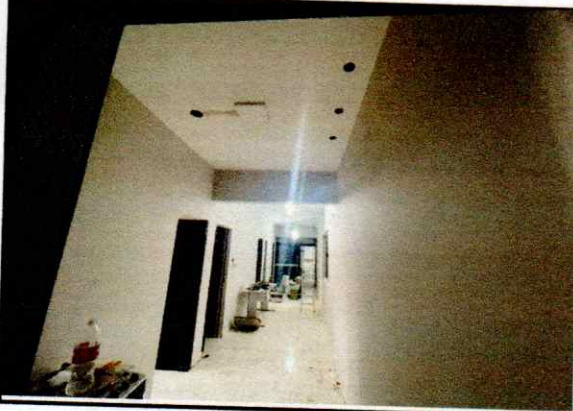


Foto 04

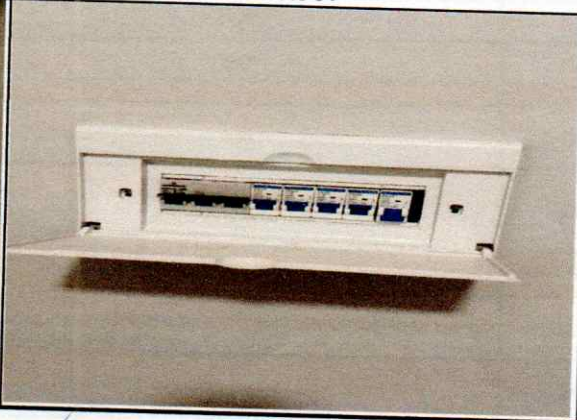

Anderson Luis Lemos de Melo
Engenheiro Civil
CREA 14.19593479PE

Vandeilson Manoel dos Santos
Presidente
CPF: 105.239.744-18

ETARUANDA
EMPREENDIMENTOS
Rua Coronel José Pessoa, 17 / Loja 201
Centro - Bezerros-PE - CEP 55.660-000
CNPJ. 39.357.688/0001-05

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

DATA: 07/11/2023

OBRA: MANUTENÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA CÂMARA DOS VEREADORES DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

LOCAL: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL	2		
ENCARREGADO	1	PEDREIRO	2		

TAREFAS REALIZADAS

1.	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO;
2.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

OCORRÊNCIAS

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

ASSINATURAS

Anderson Luis Lemos de Melo
 Engenheiro Civil
 CREA 18.19593479PE

RESPONSÁVEL TÉCNICO



TARUANDA
 EMPREENDIMENTOS
 Rua Coronel José Pessoa, 17 / Loja 201
 Centro - Bezerros - PE CEP 55.660-000
 CNPJ. 39.357.688/0001-05

CONTRATANTE

Vandilson Manoel dos Santos
 Presidente
 CPF: 105.239.744-18

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

DATA: 08/11/2023

OBRA: MANUTENÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA CÂMARA DOS VEREADORES DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE
LOCAL: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL	2		
ENCARREGADO	1	PEDREIRO	2		

TAREFAS REALIZADAS

1. DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO;
2. EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.

OCORRÊNCIAS

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

ASSINATURAS


Anderson Luis Lemos de Melo
 Engenheiro Civil
 CREA 1819593479PE



RESPONSÁVEL TÉCNICO



Rua Coronel José Pessoa, 17 / Loja 201
 Centro - Bezerros - PE / CEP 55.660-000
 CNPJ. 39.357.688/0001-05



CONTRATANTE
 Vandeilson Manoel dos Santos
 Presidente
 CPF: 105.239.744-18

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

DATA: 09/11/2023

OBRA: MANUTENÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA CÂMARA DOS VEREADORES DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

LOCAL: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL	2		
ENCARREGADO	1	PEDREIRO	2		

TAREFAS REALIZADAS

1.	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO;
2.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

OCORRÊNCIAS

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

ASSINATURAS

Anderson Luis Lemos de Melo
 Engenheiro Civil
 CREA 1819583470PE

RESPONSÁVEL TÉCNICO

TARUANDA
 EMPREENDIMENTOS
 Rua Coronel José Pessoa, 17 / Loja 201
 Centro - Bezerros-PE - CEP 55.660-000
 CNPJ: 39.357.688/0001-05


 CONTRATANTE

Vandeilson Manoel dos Santos
 Presidente
 CPF: 105.239.744-18

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

DATA: 10/11/2023

OBRA: MANUTENÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA CÂMARA DOS VEREADORES DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

LOCAL: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL	2		
ENCARREGADO	1	PEDREIRO	2		

TAREFAS REALIZADAS

1.	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO;
2.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

OCORRÊNCIAS

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

ASSINATURAS

Anderson Luis Lemos de Melo
 Engenheiro Civil
 CREA 1819593479PE

RESPONSÁVEL TÉCNICO

TARUANDA
 EMPREENDIMENTOS
 Rua Coronel José Pessoa, 17 / Loja 201
 Centro - Bezerros - PE - CEP 55.660-000
 CNPJ: 39.357.688/0001-05

Vanilson Manoel dos Santos
 Presidente
 CPF: 105.239.744-18

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

DATA: 13/11/2023

OBRA: MANUTENÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA CÂMARA DOS VEREADORES DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

LOCAL: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL	2		
ENCARREGADO	1	PEDREIRO	2		

TAREFAS REALIZADAS

1.	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO;
2.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS;
3.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS.
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

OCORRÊNCIAS

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

ASSINATURAS

Anderson Luis Lemos de Melo
 Engenheiro Civil
 CREA 18195/2479PE

RESPONSÁVEL TÉCNICO

TARUANDA
 EMPREENDIMENTOS
 Rua Coronel José Pessoa, 17 / Loja 201
 Centro - Bezerros - PE CEP 55.660-000
 CNPJ. 39.357.688/0001-05


 CONTRATANTE

Vandeilson Manoel dos Santos
 Presidente
 CPF: 105.239.744-18

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

DATA: 14/11/2023

OBRA: MANUTENÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA CÂMARA DOS VEREADORES DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE**LOCAL:** CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL	2		
ENCARREGADO	1	PEDREIRO	2		

TAREFAS REALIZADAS

1.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS;
2.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS.
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

OCORRÊNCIAS

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

ASSINATURASAnderson Luis Lemos de Melo
Engenheiro Civil
CREA 1819593479PE

RESPONSÁVEL TÉCNICO

TE TARUANDA
EMPREENHIMENTOS
Rua Coronel José Pessoa, 17 / Loja 201
Centro - Bezerros - PE CEP 55.660-000
CNPJ. 39.357.688/0001-05
CONTRATANTE
Vandeilson Manoel dos Santos
Presidente
CPF: 105.239.744-18

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

DATA: 16/11/2023

OBRA: MANUTENÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA CÂMARA DOS VEREADORES DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE
LOCAL: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL	2		
ENCARREGADO	1	PEDREIRO	2		

TAREFAS REALIZADAS

1. EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS;
2. EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.

OCORRÊNCIAS

1. OBRA PARALISADA NO DIA 15/11/2023 -> FERIADO NACIONAL
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

ASSINATURAS

Anderson Luis Lemos de Melo
 Engenheiro Civil
 CREA 1819583479PE

 RESPONSÁVEL TÉCNICO



Rua Coronel José Pessoa, 17 / Loja 201
 Centro - Bezerros - PE CEP 55.660-000
 CNPJ. 39.357.688/0001-05

 CONTRATANTE
 Vandeilson Manoel dos Santos
 Presidente
 CPF: 105.239.744-18

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

DATA: 17/11/2023

OBRA: MANUTENÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA CÂMARA DOS VEREADORES DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

LOCAL: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL	2		
ENCARREGADO	1	PEDREIRO	2		

TAREFAS REALIZADAS

1.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS;
2.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS.
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

OCORRÊNCIAS

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

ASSINATURAS

Anderson Luis Lemos de Melo
 Engenheiro Civil
 CREA 181953479PE

RESPONSÁVEL TÉCNICO

TARUANDA
 EMPREENDIMENTOS
 Rua Coronel José Pessoa, 17 / Loja 201
 Centro - Bezerros - PE - CEP 55.660-000
 CNPJ: 39.357.688/0001-05

CONTRATANTE
 Vandeilson Manoel dos Santos
 Presidente
 CPF: 105.239.744-18

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

DATA: 20/11/2023

OBRA: MANUTENÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA CÂMARA DOS VEREADORES DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

LOCAL: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL	2		
ENCARREGADO	1	PEDREIRO	2		

TAREFAS REALIZADAS

1.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS;
2.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS.
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

OCORRÊNCIAS

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

ASSINATURAS

Anderson Luis Lemos de Melo
 Engenheiro Civil
 CREA 19.195/34.79/PE

RESPONSÁVEL TÉCNICO

TARUANDA
 EMPREENDIMENTOS
 Rua Coronel José Pessoa, 17 / Loja 201
 Centro - Bezerros - PE - CEP 55.660-000
 CNPJ: 39.357.688/0001-05


 Vandeilson Manoel dos Santos
 Presidente

CPF: 105.239.744-18

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

DATA: 21/11/2023

OBRA: MANUTENÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA CÂMARA DOS VEREADORES DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

LOCAL: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL	2		
ENCARREGADO	1	PEDREIRO	2		

TAREFAS REALIZADAS

1.	INSTALAÇÃO DAS BANCADAS DE GRANITO;
2.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS.
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

OCORRÊNCIAS

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

ASSINATURAS

Anderson Luis Lemos de Melo
 Engenheiro Civil
 CREA 1810593479PE

RESPONSÁVEL TÉCNICO



Rua Coronel José Pessoa, 17 / Loja 201
 Centro - Bezerros - PE - CEP 55.660-000
 CNPJ: 39.357.688/0001-05



CONTRATANTE

Vandeilson Manoel dos Santos
 Presidente
 CPF: 105.239.744-18

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

DATA: 22/11/2023

OBRA: MANUTENÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA CÂMARA DOS VEREADORES DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

LOCAL: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL	2		
ENCARREGADO	1	PEDREIRO	2		

TAREFAS REALIZADAS

1.	INSTALAÇÃO DAS BANCADAS DE GRANITO;
2.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS.
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

OCORRÊNCIAS

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

ASSINATURAS

Anderson Luis Lemos de Melo
 Engenheiro Civil
 CREA 1819593479PE

RESPONSÁVEL TÉCNICO



Rua Coronel José Pessoa, 17 / Loja 201
 Centro - Bezerros - PE - CEP 55.660-000
 CNPJ: 39.357.688/0001-05


 CONTRATANTE
 Vandeilson Manoel dos Santos
 Presidente
 CPF: 105.239.744-18

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

DATA: 23/11/2023

OBRA: MANUTENÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA CÂMARA DOS VEREADORES DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

LOCAL: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL	2		
ENCARREGADO	1	PEDREIRO	2		

TAREFAS REALIZADAS

1.	INSTALAÇÃO DAS BANCADAS DE GRANITO;
2.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS.
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

OCORRÊNCIAS

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

ASSINATURAS

Anderson Luis Lemos de Melo
 Engenheiro Civil
 CREA 1819593479PE

RESPONSÁVEL TÉCNICO



Rua Coronel José Pessoa, 17 / Loja 201
 Centro - Bezerros - PE - CEP 55.660-000
 CNPJ. 39.357.688/0001-05


 CONTRATANTE
 Vandeilson Manoel dos Santos
 Presidente
 CPF: 105.239.744-18

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

DATA: 24/11/2023

OBRA: MANUTENÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA CÂMARA DOS VEREADORES DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

LOCAL: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL	2		
ENCARREGADO	1	PEDREIRO	2		

TAREFAS REALIZADAS

1.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS;
2.	INSTALAÇÃO DA ESCADA, TIPO MARINHEIRO, EM AÇO.
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

OCORRÊNCIAS

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

ASSINATURAS

Anderson Luis Lemos de Melo
 Engenheiro Civil
 CREA 1819593479PE

RESPONSÁVEL TÉCNICO

TARUANDA
 EMPREENDIMENTOS
 Rua Coronel José Pessoa, 17 / Loja 201
 Centro - Bezerros - PE - CEP 55.660-000
 CNPJ. 39.357.688/0001-05

CONTRATANTE

Vandeilson Manoel dos Santos
 Presidente

CPF: 105.239.744-18

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

DATA: 27/11/2023

OBRA: MANUTENÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA CÂMARA DOS VEREADORES DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

LOCAL: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL	2		
ENCARREGADO	1	PEDREIRO	2		

TAREFAS REALIZADAS

1.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS;
2.	INSTALAÇÃO DA ESCADA, TIPO MARINHEIRO, EM AÇO.
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

OCORRÊNCIAS

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

ASSINATURAS

Anderson Luis Lemos de Melo
Engenheiro Civil
CREA 1819583479PE

RESPONSÁVEL TÉCNICO



TARUANDA
EMPREENDIMENTOS
Rua Coronel José Pessoa, 17 / Loja 201
Centro - Bezerros - PE CEP: 55.660-000
CNPJ: 39.357.688/0001-05



CONTRATANTE
Vandeilson Manoel dos Santos
Presidente
CPF: 105.239.744-18

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

DATA: 28/11/2023

OBRA: MANUTENÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA CÂMARA DOS VEREADORES DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

LOCAL: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL	2		
ENCARREGADO	1	PEDREIRO	2		

TAREFAS REALIZADAS

1.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS;
2.	INSTALAÇÃO DA ESCADA, TIPO MARINHEIRO, EM AÇO.
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

OCORRÊNCIAS

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

ASSINATURAS

Anderson Luis Lemos de Melo
 Engenheiro Civil
 CREA 1819593479PE

RESPONSÁVEL TÉCNICO

TARUANDA
 EMPREENDIMENTOS
 Rua Coronel José Pessoa, 17 / Loja 201
 Centro - Bezerros - PE - CEP 55.660-000
 CNPJ. 39.357.688/0001-05

Vandeilson
 CONTRATANTE

Vandeilson Manoel dos Santos
 Presidente
 CPF: 105.239.744-18
